

## Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: **Žlutice, rekonstrukce ul. Dukelských hrdinů**číslo objektu/  
číslo změny objektu:

číslo změny:

Název objektu:

**1**

Obsah:

Krycí list:

Záznam o změně - počet stran A4

8

Grafické přílohy - počet stran A4

3

Další přílohy - počet stran A4

5

číslo příjemce  
paré

1 Dodavatel

2 Projektant

3 Stavební dozor

Iniciátor změny: Investor

Přehled změn:

číslo změny vč. Textu	VÍCEPRÁCE	ÚSPORY	CELKEM ZMĚNA
ZM 1 - KSC za ŠD a geotextílii	327 500,00 Kč	-243 750,00 Kč	83 750,00 Kč
ZM 2 - Obrubníky u ecodreйнů	102 900,00 Kč	0,00 Kč	102 900,00 Kč
ZM 3 - Plocha ul. Čechova	245 105,18 Kč	0,00 Kč	245 105,18 Kč

Přílohy:

Příloha č. 1 - Popis změn  
Příloha č. 2 – Rozpočet ZM č.1  
Příloha č.3 – Situace ke změnám konstrukce ZM č.1  
Příloha č.4 – Rozpočet ZM č.2  
Příloha č.5 – Situace osazení žulových obrubníků k ZM č.2  
Příloha č. 6 – Rozpočet ZM č.3

Příloha č.7 – Situace k změně rozšíření ploch ulice Čechova ZM č.3

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
<b>7 940 932,38 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>431 755,18 Kč</b>	<b>8 372 687,56 Kč</b>	<b>5,2%</b>

Zhotovitel

datum

podpis

Projektant (autorský dozor)

datum

podpis

TDI stavby

datum

podpis

Objednatel

datum

podpis

Street line s.r.o.

Změnový list č.1 . ke stavbě „Žlutice, rekonstrukce ul. Dukelských hrdinů“

**Příloha č.1****Podrobný popis jednotlivých změn**

- Změnový list č. 1 – Změnový list řeší, záměnu vrstvy stabilizace tl.16 za vrstvu štěrkodrtě tl. 15 cm a zpevnění pláň geotextílií. Důvodem jsou nízko uložené stávající inženýrské sítě, zejména teplovod. Novým řešením je zlepšení jejich ochrana. Současně je lepší odvod dešťových vod.
- Změnový list č. 2 – Změnový list řeší osazení žulových obrubníků u nově osazených ekodreinů. Toto řešení zvyšuje ochranu ekodreinů a jejich ochranu proti poškození. Dále zvyšují kapacitu zachycení povrchových vod. Je to stejné řešení jako v ulici Karlovarská.  $6 \times 3,5 \times 2 = 42 \text{bm}$
- Změnový list č. 3 – Změnový list řeší požadavek investora o prodloužení (dorovnání) nově budovaných ploch v ulici Čechova. Délka úpravy 18,75 bm, šířka chodníku 2m a šířka komunikace 3,5 bm. Jedná se o nové plochy v celkové výměře  $18,75 \times 5,5 \text{m} = 103,13 \text{ m}^2$

ZM 1 - KSC za ŠD a geotextílii

**Rozpočet změny**

**Stavba:**

Žlutice, rekonstrukce ul. Dukelských hrdinů

**Objekt:**

						Rozpočet		Celkem změna č.1	
								83 750,00 Kč	
ROZDĚLE	Objekt2	poř.číslo	číslo položky	Název položky	jed.	Kč/jed.	SI SI	množství43	celkem54
NÍ							0 0		
0	SO 101	33	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	195,00 Kč		-1 250,00	-243 750,00 Kč
0	VC1	0	0	Dodávka geotextílie	m2	65,00 Kč		1 250,00	81 250,00 Kč
0	VC1	0	0	Položení geotextílie	m2	22,00 Kč		1 250,00	27 500,00 Kč
0	VC1	0	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	175,00 Kč		1 250,00	218 750,00 Kč
			CELKEM	bez DPH					83 750,00 Kč

Datum:

Za zhotovitele:

Street line s.r.o.

Zinženýrový list č.1 . ke stavbě „Žlutice, rekonstrukce ul. Dukelských hrdinů“



## Rozpočet změny

Žlutice, rekonstrukce ul. Dukelských hrdinů

**Stavba:**

**Objekt:**

## ZM 2 - Obrubníky u ecodreinů

[illegible]

Datum:

**Za zhotovitele:**



ZM 3 - Plocha ul. Čechova

# Rozpočet změny

**Stavba:** Žlutice, rekonstrukce ul. Dukelských hrdinů

**Objekt:**

**Rozpočet**

**Celkem změna č.3**

245 105,18 Kč

ROZDĚLE	Objekt2	poř.číslo	číslo položky	Název položky	jed.	Kč/jed.	SI	SI	množství43	celkem54
NÍ										
0	SO 101	1	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně	m2	75,00 Kč			37,50	2 812,50 Kč
0	SO 101	3	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m	m2	185,00 Kč			65,63	12 140,63 Kč
0	SO 101	7	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	165,00 Kč			103,13	17 015,63 Kč
0	SO 101	9	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	95,00 Kč			18,75	1 781,25 Kč
0	SO 101	12	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti	m3	150,00 Kč			30,94	4 640,63 Kč
0	SO 101	14	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II,	m3	120,00 Kč			30,94	3 712,50 Kč
0	SO 101	15	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti	m3	5,00 Kč			309,38	1 546,88 Kč
0	SO 101	19	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu	t	150,00 Kč			52,59	7 889,06 Kč
0	SO 101	21	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	12,00 Kč			103,13	1 237,50 Kč
0	SO 101	31	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	180,00 Kč			103,13	18 562,50 Kč
0	SO 101	35	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	530,00 Kč			103,13	54 656,25 Kč
žula	SO 101	36	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	720,00 Kč			37,50	27 000,00 Kč
0	SO 101	57	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	650,00 Kč			18,75	12 187,50 Kč
žula	SO 101	58	58380006	obrubník kamenný žulový přímý 200x200mm	m	2 230,00 Kč			18,75	41 812,50 Kč
0	SO 101	81	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým	t	145,00 Kč			122,72	17 794,22 Kč
0	VC1	0	0	Položení geotextilie	m2	22,00 Kč			103,13	2 268,75 Kč
0	VC1	0	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	175,00 Kč			103,13	18 046,88 Kč

			CELKEM	bez DPH					245 105,18 Kč

Datum:


Za zhotovitele:

Street line s.r.o.

Zinženýrový list č. 1. - ke stavbě „Žlutice, rekonstrukce ul. Dukelských hrdinů“



**Příloha č.7 – Situace k změně rozšíření ploch ulice Čechova ZM č.3**

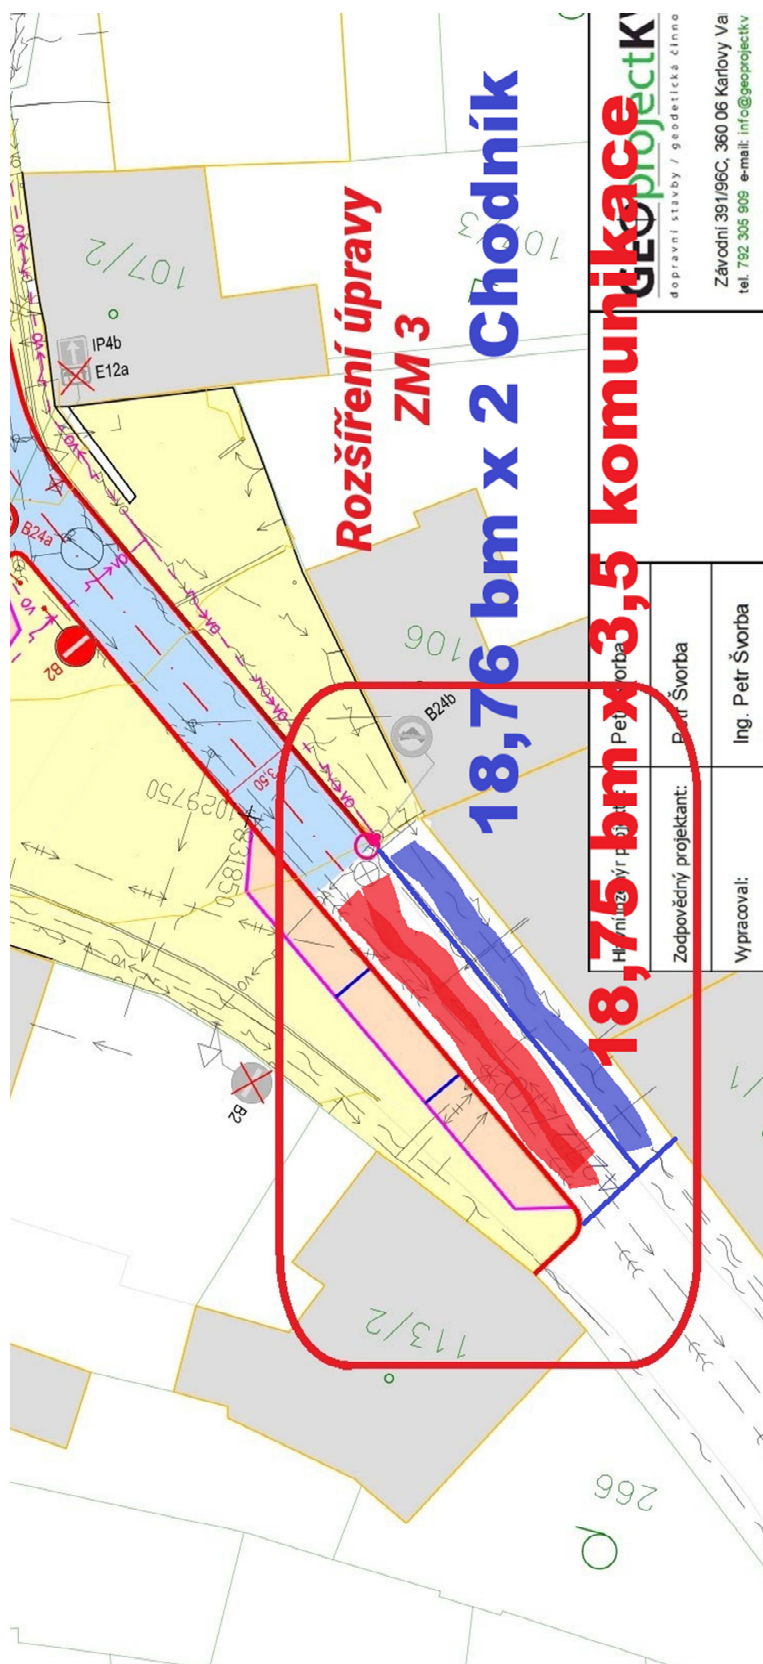

Street line s.r.o.

Změnový list č.1 . ke stavbě „Žlutice, rekonstrukce ul. Dukelských hrdinů“
